



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

1. 着工前

設置場所で標識を持った浄化槽
設備士の顔が分かる



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

2. 地業

転圧状況、厚さ（100mm以上）が
分かる




浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

3. 基礎コンクリート配筋

配筋状況、ピッチ（参考D10mm
@200mm）、スパーサー等が分か
る

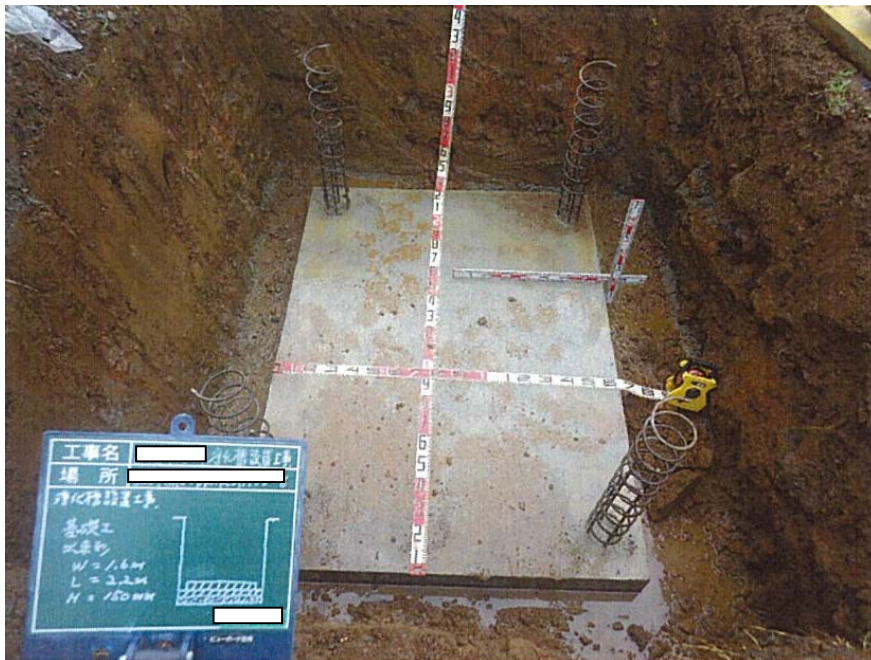

浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

4. 基礎コンクリート出来形

長さ、幅、厚さが分かる



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

5. 浄化槽本体

メーカー、形式が分かる

※据付前



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

6. 据付

水張り、水平確認、浄化槽設備
士の顔が分かる



工事名 浄化槽設置工事
場所
埋戻し(土・砂利)
敷均し・転圧
水締め


浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

7. 埋戻し

埋戻し、締固め状況が分かる

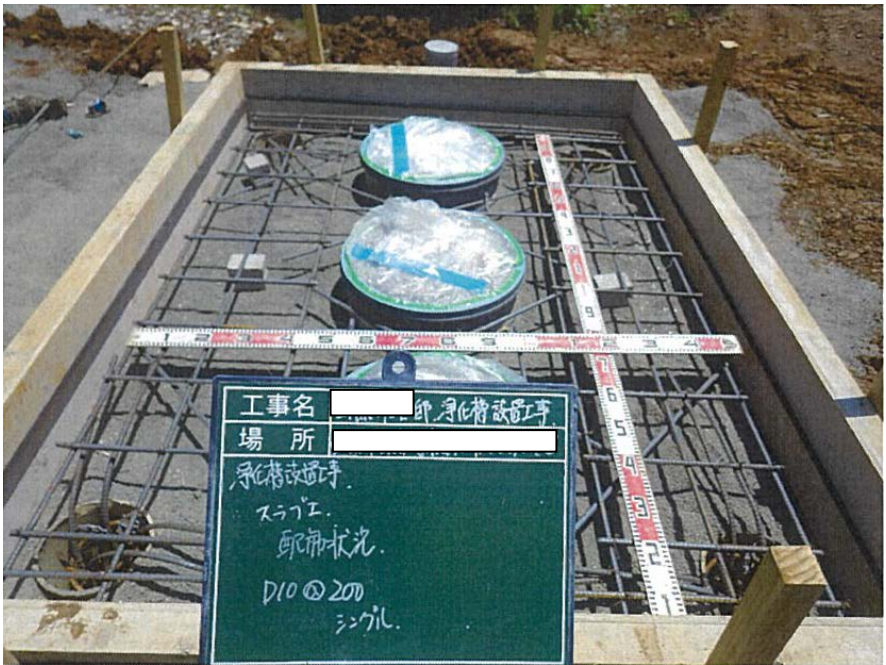

工事名 浄化槽設置工事
場所
浄化槽改修時
スラブ工
配筋状況
D10 @ 200
シングル

浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

8. 上部スラブ配筋

配筋状況、ピッチ（参考D10mm @200mm）、スパーサー等が分かる



工事名 浄化槽設置工事
場所
浄化槽改修時
スラブ工
出来形
L=2.2m
W=1.6m
H=0.15m

浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

9. 上部スラブ出来形

長さ、幅、厚さが分かる



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

10. かさ上げ

上部スラブ完成後に厚さ（300mm以内）が分かる



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

11. 流入管

浄化槽までの流入管布設状況が分かる

※埋戻し前



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

12. 放流先

敷地内のマス・排水管に接続する場合、その先の放流先（側溝、川、海等）が分かる



浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

13. 完成

設置場所で標識を持った浄化槽
設備士の顔が分かる

浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽

浄化槽設置整備事業

西海 太郎 邸

○人槽
